



Reporte visita técnica

Instalación de sistema FV

INTERNO

Antecedentes


Nombre del cliente	Ricardo Morales
Número del cliente	
Dirección	Las Tórtolas 2658
Comuna	Las Condes
Fecha Visita	30/11/2024
Coordenadas	-33.409421955812505, -70.51717719638663
Técnico/s de la visita	Alejandro Aguirre

Factibilidad de instalación sistema FV

Factibilidad sistema FV	Factible
Sistema Propuesto	Sí
Tipo de sistema	On grid
Cantidad y tipo de paneles	12 paneles Trina Solar de 550 Wp
Tamaño de sistema	6,6 kWp
Inversor	Huawei SUN2000-5KTL-L1 de 5 kW
Días estimados de instalación	5
Sistema máximo factible de instalar (INTERNO)	15 paneles

Empalme

Número de medidor	4413084
Protección de medidor	40
Red	Monofásica

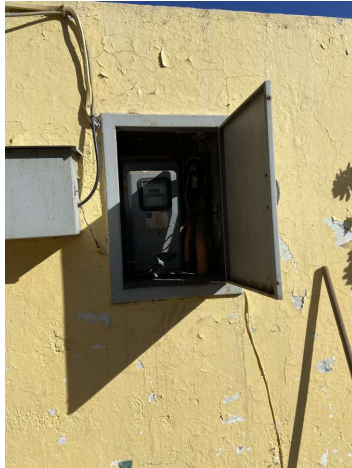



Conductores (INTERNO)



¿Tiene generador?



NO



Punto de conexión (INTERNO)



¿Necesita extensión de cables?	SI
Comentarios	- Se instalará una caja de derivación metálica y se realizará una extensión de cables hasta el nuevo tablero


Tablero existente

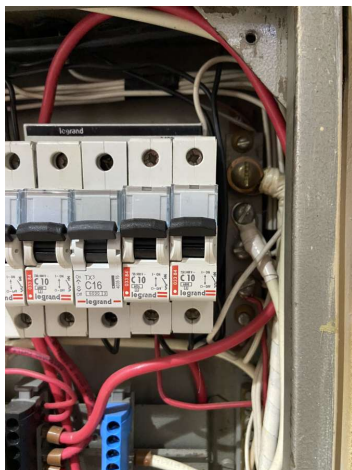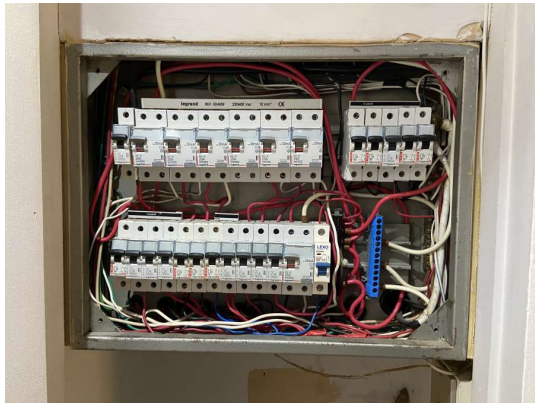


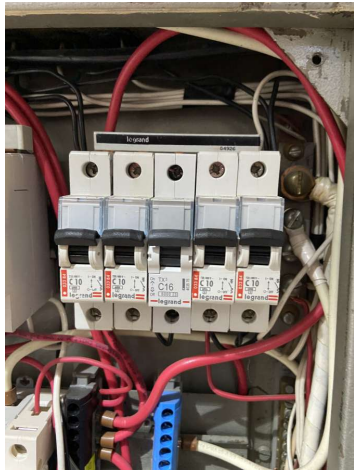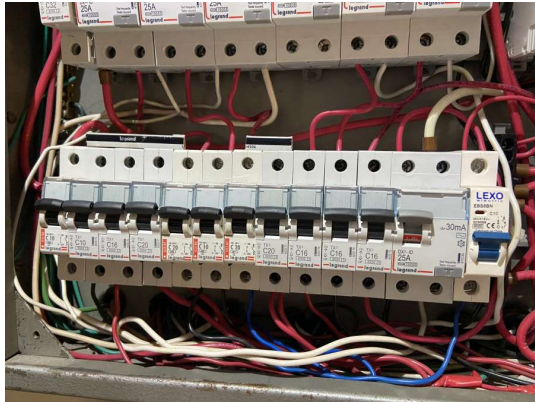

Techo o superficie


Tipo de superficie de instalación	Techo
-----------------------------------	-------

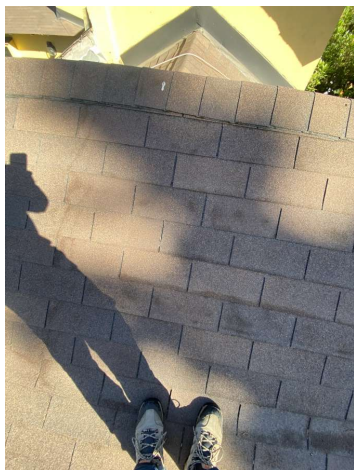


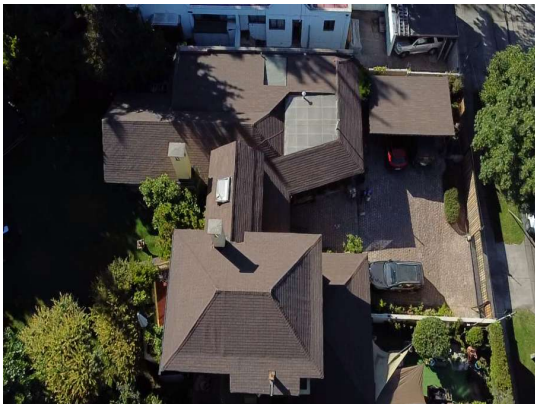





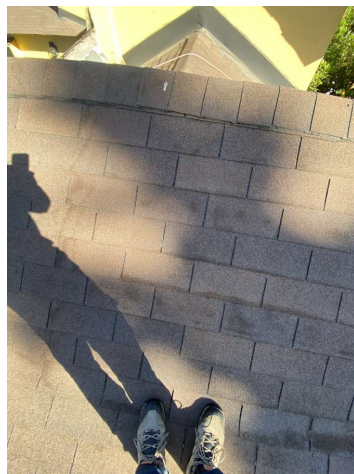

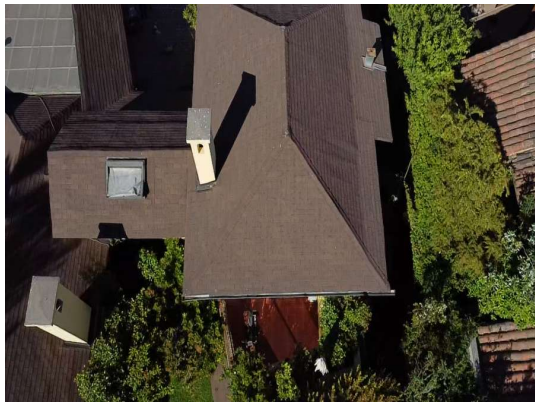

Tipo de estructura FV	Ajustable Coplanar
Material de la superficie	Teja asfáltica
Inclinación de la superficie (INTERNO)	22
Orientación	Norponiente
Desviación respecto al norte	-26
Posición de módulos	Horizontal Vertical
Cuerdas de vida para la instalación (INTERNO)	NO
Sombra	NO

Singularidad	NO
--------------	----

Inversor y tablero FV

Configuracion instalación (INTERNO)	NTGFV
-------------------------------------	-------



Dimensiones espacio inversor y tablero (INTERNO)	1.90
¿El espacio del inversor cuenta con techo o alero? (INTERNO)	SI
Intensidad del wifi	media
¿El inversor va en el mismo muro del tablero?	Sí
¿Tierra neutralizada? (INTERNO)	no

Canalizaciones



Panel - inversor

Tipo de canalización	Sobrepuesta - emt
----------------------	-------------------

Inversor - NTGFV

Distancia (metros)	1
Tipo de canalización	Sobrepuesta - emt

NTGFV - empalme

Distancia (metros)	10
Tipo de canalización	Sobrepuesta - emt

Referencia de instalación de paneles



Glosario

Inversor



Empalme



Punto conexión



TFV



TDA



Camarilla de registro

